



Réalisez le cadrage d'un projet IA

Projet 12 - Julien Agneray

Contexte & Objectifs du projet





Sommaire

1. Expression des besoins & formalisation
2. Organisation du projet
3. Estimation des charges & chiffrage
4. Infrastructure technique
5. Rentabilité & projections
6. Pilotage & déroulement projet
7. Conformité & gestion des risques
8. Questions

Expression des besoins & user stories



Répartition des rôles & profils projet

NOTRE ÉQUIPE



PRODUCT OWNER



SCRUM MASTER



DATA SCIENTIST



DÉVELOPPEUR




UX/UI DESIGNER



EXPERT IA

Estimation des charges par user story

Recommandation à partir de photos



DS: 20% / 1,6 jou
Dev: 60% / 4,8 jo
UX/UI: 20% / 1,6 j

Total: 8 jours


Recommandation intelligente personnalisée



DS: 60% / 7,8 jours
Dev: 30% / 3,9 jours
UX/UI: 10% / 1,3 jou

Total: 13 jours


Prévisualisation du vêtement recommandé



DS: 30% / 2,4 jours
Dev: 50% / 4 jours
UX/UI: 20% / 1,6 jou

Total: 8 jours


Personnalisation du vêtement recommandé



DS: 10% / 0,5 jours
Dev: 60% / 3 jours
UX/UI: 30% / 1,5 jo

Total: 5 jours

Recommandation selon préférences personnelles



DS: 50% / 5 jours
Dev: 40% / 4 jours
UX/UI: 10% / 1 jour

Total: 10 jours

Donner un avis sur les recommandations IA




DS: 10% / 0,3 jours
Dev: 70% / 2,1 jours
UX/UI: 20% / 0,8 jou

Total: 3 jours


Coût des profils techniques

Tarifs journaliers des profils techniques

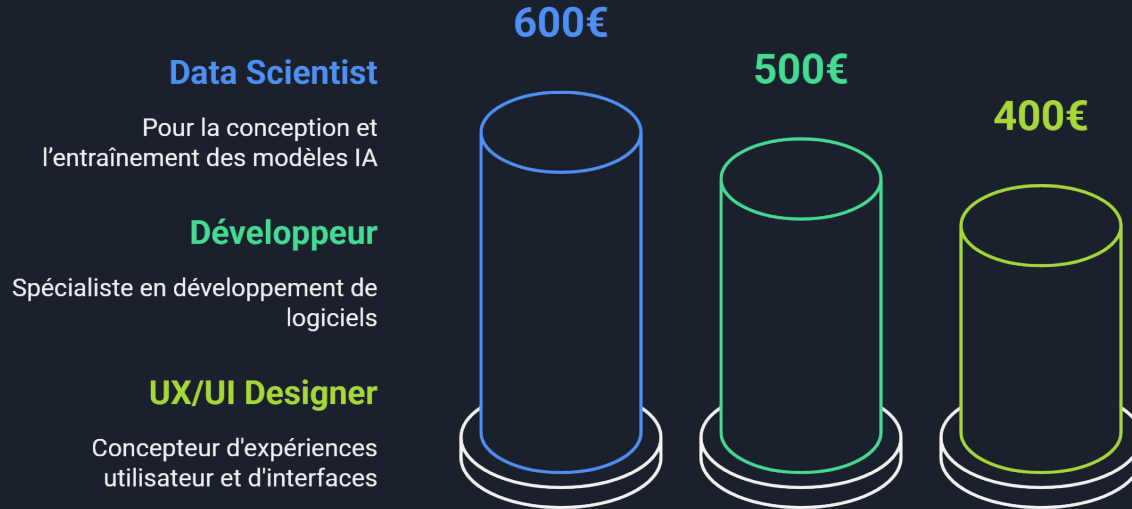

Profils transverses & impact budgétaire

Tarifs journaliers des rôles de projet

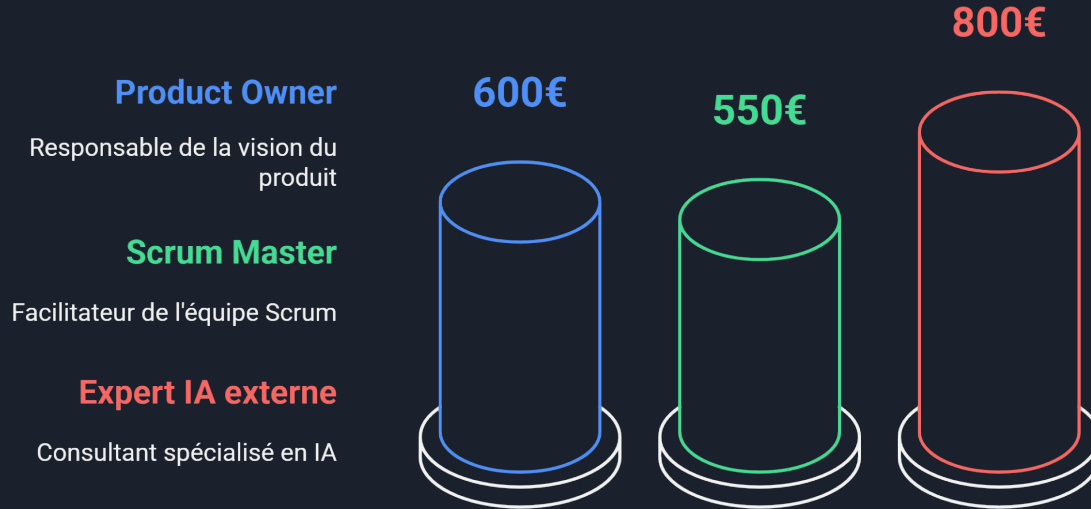

Coûts d'infrastructure Azure

Phase d'entraînement IA


Utilisation ponctuelle de VM GPU
pour l'entraînement

Phase de production

Infrastructure légère pour le
stockage et l'exécution


Prédictions

Exécutions gratuites via Azure
Functions

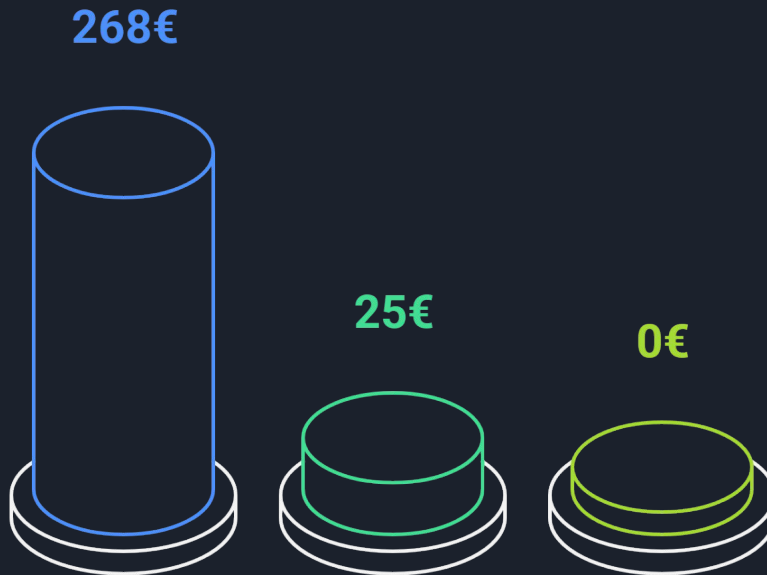


Projection de rentabilité & ROI

Évolution des coûts et des gains cumulés (sur 12 ans)

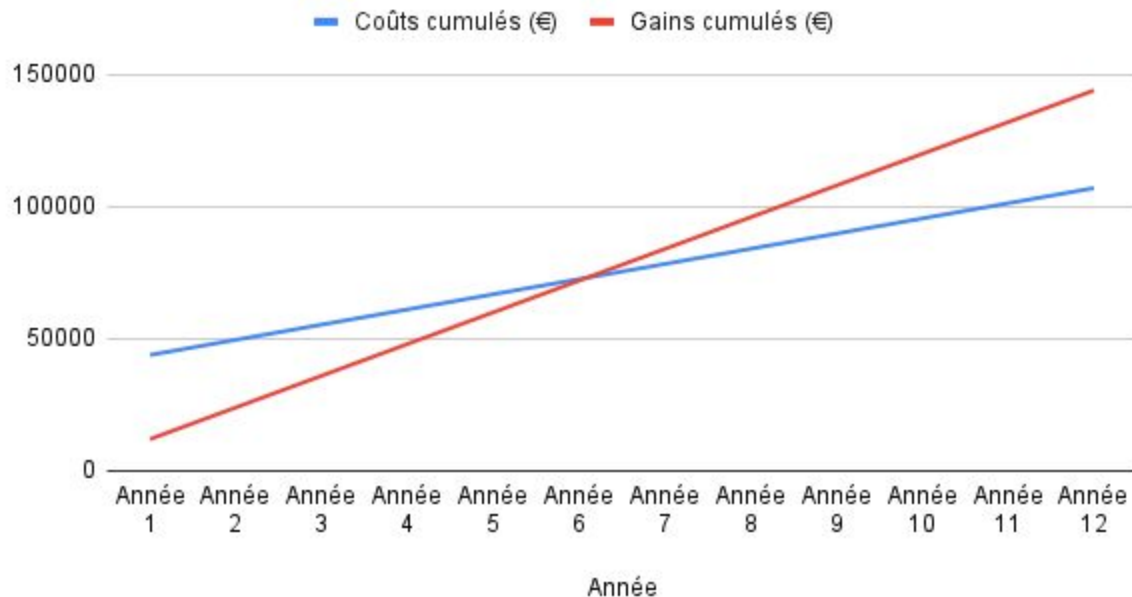

Planification des sprints


Chronologie du développement du projet : Cinq sprints vers le succès

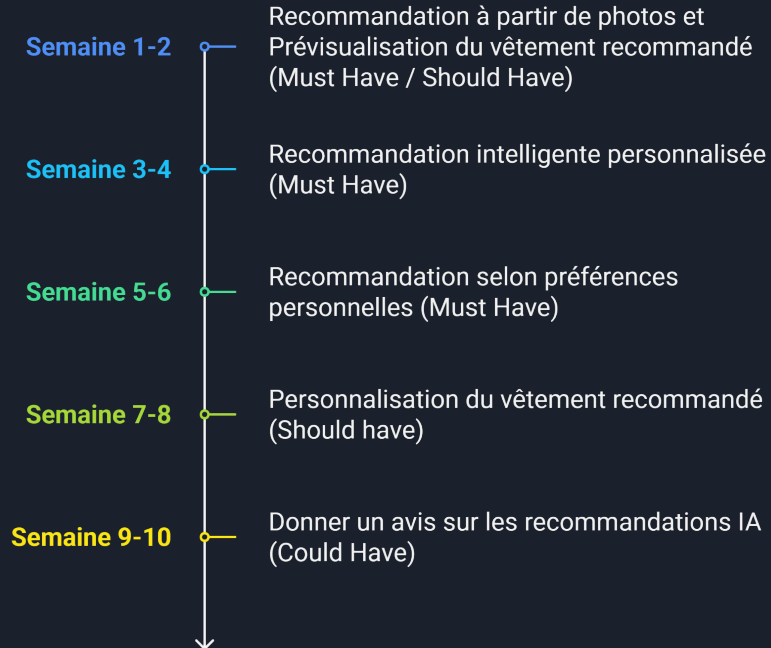


Organisation agile SCRUM



SPRINT PLANNING



DAILY SCRUM

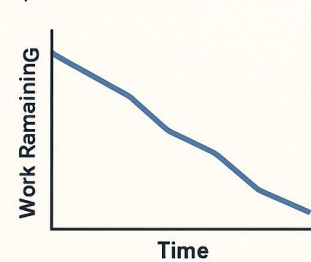

BURNDOWN CHART




SPRINT REVIEW



SPRINT RETROSPECTIVE

Respect RGPD

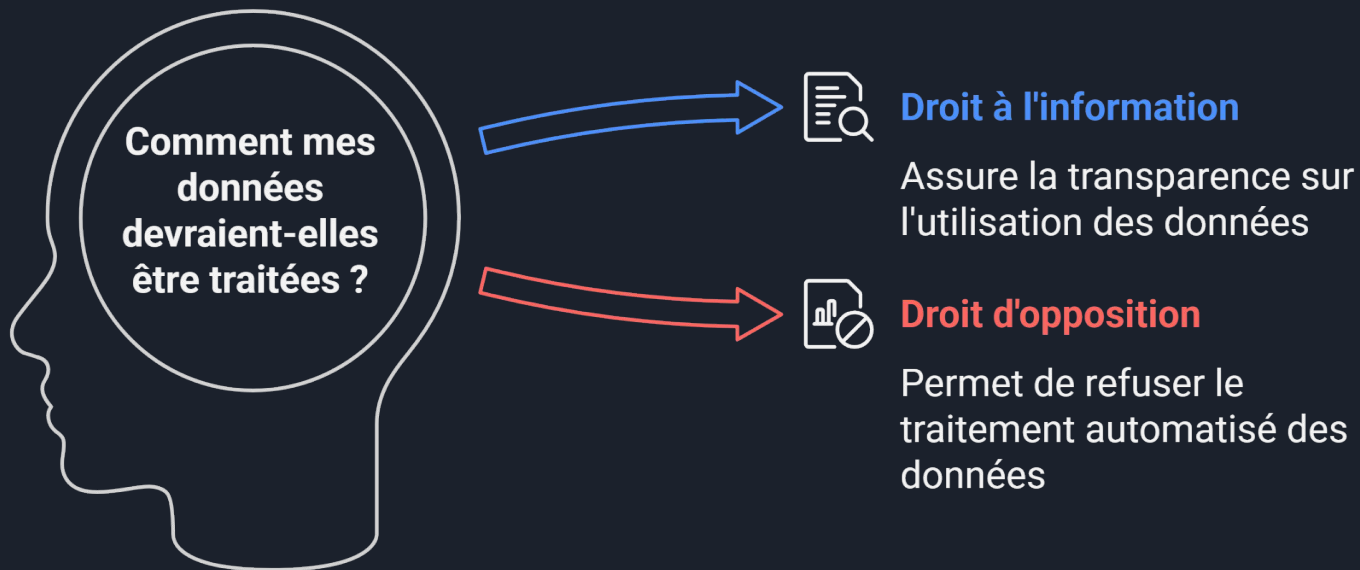

Enjeux éthiques & biais IA

Atténuation des Risques de Personnalisation

1

Biais Algorithmique

Reconnaissance des biais dans les données d'entraînement

2

Préoccupations de Confidentialité

Aborder les problèmes de consentement et de perception des données


3

Bulles Comportementales

Prévenir l'isolement stylistique dû à la personnalisation excessive



Analyse des risques & plan d'actions

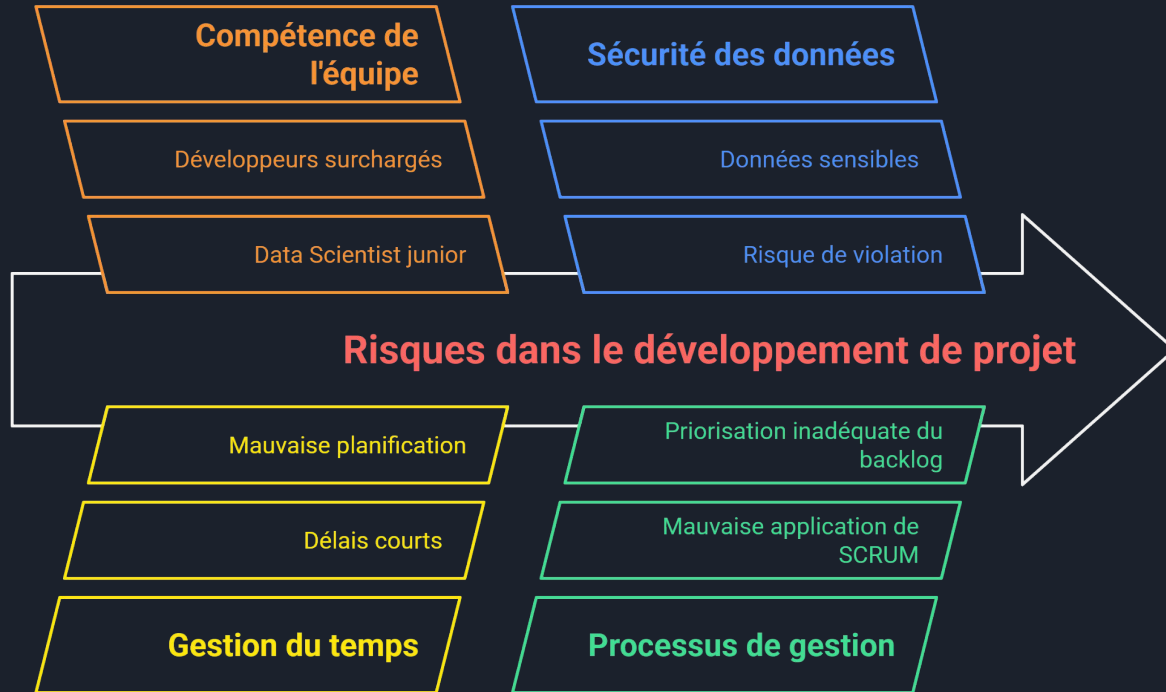

Conclusion & perspectives

TRANSFORMATION DIGITALE

Intelligence artificielle au service de la personnalisation,
de l'engagement client, et de la performance commerciale



Avez-vous des questions?

